



**Prefeitura Municipal
de Franca**

(16)3711-9000
Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova
Franca/SP - Cep: 14401-150
CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: isento

Franca, 09 de junho de 2022

Ofício nº247/2022 - GABP


Assunto: Resposta ao Requerimento nº 184/2022.

Considerando a manifestação do Secretário de Infraestrutura, Sr. Nicola Rossano Costa.

Encaminho a resposta ao **Requerimento nº 184/2022**, do Ilmo. Vereador Gilson Pelizaro.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
Prefeito Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Endereço: Rua da Câmara, nº 1, Parque das Águas, CEP: 14401-306.
Telefone: (16) 3713 1555. WhatsApp: (16) 99321-2646.
E-mail: camara@franca.sp.leg.br.

Memorando 162/2022 - SINFRA

Franca, 08 de junho de 2022


Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: Requerimento nº 184/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação do requerimento nº 184/2022 do nobre Vereador Gilson Pelizaro, encaminho anexo o projeto e cronograma.

Cordialmente,



Nicola Rossano Costa
Secretário de Infraestrutura



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.franca.sp.leg.br




EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA - SP

REQUERIMENTO nº 184 /2022

ENCAMINHAMENTO
Para NICOLA
para estudos e/ou providências
relacionando a DERG/GABIP até
dia 28/05/22
Franca, 18/05/22

DESPACHO
Encaminha-se. Aprovado


Sala de Sessões, 17/05/2022


Presidente

O Vereador que este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, ouvido o Augusto Plenário, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal a fim de fornecer a esta Casa **cópia do projeto de engenharia de reforma das instalações da Escola Profa. Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci**, situada na Rua Manoel Francisco de Mello, nº 472, no Jardim Marília.

A escola em questão em breve passará por reformas, ao que se faz necessário o seu correto acompanhamento, razão do presente Requerimento, **cujo projeto deve vir acompanhado do cronograma das obras**, pelo que ora suscitamos o Poder Executivo.

Câmara Municipal de Franca/SP, 16 de maio de 2022.


Gilson Pelizaro
VEREADOR





CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Referência : Sinapi Dezembro/2021 (Desonerado)

Data:24/02/2022

OBRA : CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO : CONSTRUÇÃO DA E.M. PROFª NADEIDE DE LOURDES OLIVEIRA SCARABUCCI

LOCAL : RUA MANOEL FRANCISCO MELLO Nº 472

JARDIM MARILIA - FRANCA-SP

LEIS SOCIAIS SINAPI=84,97% BDI=20%



ÁREA DO TERRENO = 2.523,00 M²

Á COSTRUIR= 1.340,20 M²

ÁREA DA QUADRA EXISTENTE= 338,69 M²

ÁREA TOTAL= 1.678,89 M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,78%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	TRABALHOS EM TERRA	0,90%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	PISO	4,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
4	GRAMA	0,12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
5	FECHAMENTOS DE DIVISA	2,31%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	FUNDAÇÕES	6,31%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	INFRA-ESTRUTURA	5,41%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	SUPER-ESTRUTURA	12,78%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	6,75%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	COBERTURA	14,42%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,81%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	ESQUADRIAS/FERRAGENS	8,57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
13	REVESTIMENTOS	5,83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%
14	PINTURA	5,07%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA	4,43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%
16	PARA-RAIO	1,94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	1,40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	40%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
ACUMULADO		100,00%	4,22%	6,92%	4,94%	7,14%	8,07%	7,61%	6,35%	8,18%	6,74%	8,54%	8,21%	7,99%	6,60%	8,49%



RUA MANOEL FRANCISCO MELO

QUADRO DE ESQUADRIAS

VITROS PARA ALVENARIA						
Nº	TIPO	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANTIDADE
V-01	Vitro de correr	Vidro / Alumínio	2,00	1,00	1,10	02
V-02	Vitro de correr	Vidro / Alumínio	2,00	1,60	1,00	12
V-03	Vitro de correr	Vidro / Alumínio	2,40	1,60	1,00	24
V-04	Vitro de correr - 2F	Alumínio/T. mosquiteiro	1,20	1,00	0,85	01
V-05	Vitro basculante	Ferro/Vidrio	1,50	0,60	2,00	08
V-06	Vitro basculante	Ferro/Vidrio	1,00	0,60	2,00	03
V-07	Vitro basculante	Ferro/Vidrio	2,00	0,60	2,00	02

VITROS PARA DRYWALL							
V-08	Vitrô basculante	Vidro / Alumínio	1,00	0,40	2,10	02	Salas de Aula
V-09	Vitrô basculante	Vidro / Alumínio	2,00	0,40	2,10	03	
V-10	Vitrô basculante	Vidro / Alumínio	3,00	0,40	2,10	05	
V-11	Janela correr	Vidro / Alumínio	1,00	1,15	0,85	01	

PORTAS PARA ALVENARIA								
Nº	TIPO	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO	AMBIENTE
P-01	Porta de abrir	Madeira	0,82	2,10	..	08		Sant. Adm., Dep. Alm., Dep. Urens., Sant. alunos, Dep. Mem. Didático
P-02	Porta de abrir	Madeira	0,90	2,10	..	03		Sanitário PNE
P-03	Porta de abrir	Ferro	0,82	2,10	..	01		Área de Serviço
P-04	Porta de abrir	Ferro	0,90	2,10	..	02	Porta cozinha com tela mosquiteiro	Cozinha, Circulação Administração
P-05	Porta de abrir - 2 folhas	Ferro e Vidro	2,00	2,10	..	04		Refeitório
P-07	Porta de correr - 2 folhas	Gradi de ferro	2,42	2,60	..	02		Acesso do bloco das salas de aula
P-08	Portão de correr	Ferro	2,00	2,30	..	02		Entrada de aluno e muro interno
P-09	Portão de correr	Ferro	3,20	2,30	..	01		Acesso sanitário
P-10	Portão de abrir - 2 folhas	Gradi eletrofundido	3,00	2,35	..	01		Gradi do acesso administrativo (utilizar pedão DFE - FT 35)
P-11	Portão de abrir	Madeira	0,60	1,50	0,20	12		Box dos sanitários

OBS. Todas as portas na alvenaria deverão receber soleira de granito.

PORTAS PARA DRYWALL							
P-12	Porta de abrir	Madeira	0,90	2,10	-	18	Salas de aula
P-13	Porta de abrir	Madeira	0,82	2,10	-	03	DML, Dep. Ed. Física, Copa da Administração


LOUSAS								
LG-08	Lousa	Branca multifuncional	5,00	1,20	0,70	08	Utilizar padrão FDE - mobiliário - LG 08	Salas de aula
LG-09	Lousa	Branca multifuncional	2,50	1,20	0,70	01	Utilizar padrão FDE - mobiliário - LG 08	Sala informática

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA E.M. PROF. NADEIDE DE
LOURDES OLIVEIRA SCARABUCCI
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - SP

PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA BAIXA - VISTAS

LOCAL: Lotes 05/06/07/08/09/11/15/16/17 e 18
Quadra 04 - Jardim Marília - FRANCA - SP
R. MANOEL FRANCISCO MELLO Nº 472

LOCALIZAÇÃO:

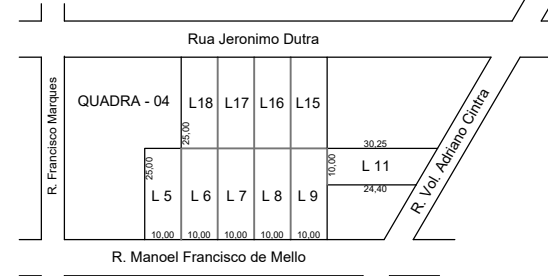

PRANCHA:
01/05

DESENHO:

MCSF

Nº CADASTRO	
-------------	--

01.1.12.10.019.05.00

ART.:

ÁREAS	(m²)
TERRENO	2.523,00
SALAS DE AULA	837,09
ADMINISTRAÇÃO	284,70
REFEITÓRIO	166,08
COBERTURAS LEVES	52,33
TOTAL A CONSTRUIR	1.340,20
QUADRA -EXISTENTE	338,69
TOTAL GERAL	1.678,89
TO (%)	66,54

PROPRIETÁRIO	
---------------------	--

PROJETO	
CALL: A 8009 - 7	

	MARIA CECILIA SODRE FUENT
--	---------------------------

RESP. TECNICO	
CREA:	

APROVAÇÃO:
